N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		OS demarrage	0 jour	Ven 15/03/13	Ven 15/03/13	
2		PREPARATION DE CHANTIER	20 jours	Ven 15/03/13	Jeu 11/04/13	1
3						
4		**TRAVAUX REHABILITATION**	**377 jours**	**Ven 15/03/13**	**Lun 25/08/14**	
5		**INSTALLATION DE CHANTIER**	**65 jours**	**Ven 12/04/13**	**Jeu 11/07/13**	
6		Installation cloture et raccordement de la base vie provisoire	15 jours	Ven 12/04/13	Jeu 02/05/13	2
7		Installation de la base vie dans les appartements du R+1	5 jours	Ven 03/05/13	Jeu 09/05/13	6
8		Installation base vie RDC	15 jours	Ven 21/06/13	Jeu 11/07/13	14
9		Réalisation d'un appartement témoin	20 jours	Ven 27/12/13	Jeu 23/01/14	53
10						
11		**LOT 01 : DEPLOMBAGE/ DESAMIANTAGE**	**75 jours**	**Ven 15/03/13**	**Jeu 27/06/13**	
12		Plan de retrait	30 jours	Ven 15/03/13	Jeu 25/04/13	1
13		Installation spécifique	10 jours	Ven 10/05/13	Jeu 23/05/13	19
14		Désamiantage RDC et souche en toiture	20 jours	Ven 24/05/13	Jeu 20/06/13	13
15		Déplombage	20 jours	Ven 24/05/13	Jeu 20/06/13	13
16		Depose installation spécifique	5 jours	Ven 21/06/13	Jeu 27/06/13	14
17						
18		**LOT 02 :DEMOLITION / MACONNERIE**	**300 jours**	**Ven 12/04/13**	**Jeu 05/06/14**	
19		Montage échafaudage façade rue et arrière	20 jours	Ven 12/04/13	Jeu 09/05/13	2
20		Depose echafaudage	20 jours	Ven 09/05/14	Jeu 05/06/14	72
21		**DEMOLITION**	**55 jours**	**Ven 21/06/13**	**Jeu 05/09/13**	
22		Curage/ démolition intérieure	50 jours	Ven 28/06/13	Jeu 05/09/13	16
23		Depose metallerie façade rue	10 jours	Ven 21/06/13	Jeu 04/07/13	14
24		Sciage des parties saillantes façade rue/arrière	15 jours	Ven 05/07/13	Jeu 25/07/13	23
25		Piquage enduit façade rue / arrière	30 jours	Ven 05/07/13	Jeu 15/08/13	23
26		Depose souche en toiture	3 jours	Ven 26/07/13	Mar 30/07/13	24
27		Demolition mur et cloison cave	3 sm	Ven 26/07/13	Jeu 15/08/13	24
28						
29		**MACONNERIE**	**112 jours**	**Ven 26/07/13**	**Lun 30/12/13**	
30		Maçonnerie/bouchement tremies/baie	40 jours	Ven 06/09/13	Jeu 31/10/13	22
31		Grattage passivation partie metallique	15 jours	Ven 26/07/13	Jeu 15/08/13	24
32		Creation tremie gaine / baie	50 jours	Ven 16/08/13	Jeu 24/10/13	31
33		Modification des baies/Appuis de baie	40 jours	Ven 06/09/13	Jeu 31/10/13	30DD
34		Flocage	2 jours	Ven 27/12/13	Lun 30/12/13	53
35		Maçonnerie cave	10 jours	Ven 16/08/13	Jeu 29/08/13	27
36						
37		**LOT 03 : CHARPENTE -COUVERTURE**	**65 jours**	**Ven 06/09/13**	**Jeu 05/12/13**	
38		Depose couverture/EP existante/bachage protection	15 jours	Ven 04/10/13	Jeu 24/10/13	39
39		Revision et rehabilitation charpente et réalisation chevêtre desefumage	20 jours	Ven 06/09/13	Jeu 03/10/13	22
40		Pose nouvelle couverture/EP neuve+chassis desenfumage	15 jours	Ven 25/10/13	Jeu 14/11/13	38
41		Charpente neuve RDC	10 jours	Ven 15/11/13	Jeu 28/11/13	40
42		Couverture neuve RDC	5 jours	Ven 29/11/13	Jeu 05/12/13	41
43		Isolation thermique	15 jours	Ven 15/11/13	Jeu 05/12/13	40
44						
45		**LOT 04 : ETANCHEITE**	**150 jours**	**Ven 06/12/1**	**Jeu 03/07/1**	
46		En toiture terrasse R+4	15 jours	Ven 06/12/1	Jeu 26/12/1	42
47		Sol courette	20 jours	Ven 06/06/1	Jeu 03/07/1	20
48						
49		**LOT 05 : MENUISERIES EXTERIEURE**	**140 jours**	**Ven 14/06/1**	**Jeu 26/12/1**	
50		Fabrication des menuiseries extérieures	8 sm	Ven 06/09/13	Ven 01/11/13	52DF
51		Dépose des menuiseries extérieures existantes	10 jours	Ven 14/06/13	Ven 28/06/13	22DF
52		Nouvelles menuiseries extérieure	35 jours	Ven 01/11/1	Jeu 19/12/1	30
53		Asservissement et restauration porte entrée	5 jours	Ven 20/12/13	Jeu 26/12/13	52
54						
55		**LOT 06:ISOLATION / CLOISONS / PLATRERIE**	**81 jours**	**Ven 15/11/13**	**Ven 07/03/14**	
56		Cloison séparative	20 jours	Ven 20/12/1	Jeu 16/01/1	52
57		Isolation-doublage thermique et acoustique	30 jours	Ven 15/11/13	Jeu 26/12/13	52DD jours
58		Faux plafonds	15 jours	Ven 14/02/1	Ven 07/03/	60
59		Gaine technique	20 jours	Ven 20/12/1	Jeu 16/01/1	52
60		Platrerie	20 jours	Ven 17/01/1	Jeu 13/02/1	56
61						
62		**LOT 07 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS / PARQUET**	**55 jours**	**Ven 03/01/14**	**Jeu 20/03/14**	
63		Mise en œuvre des nouveaux blocs portes, plinthes et placards	40 jours	Ven 03/01/14	Jeu 27/02/14	56DD jours
64		Porte int sas	5 jours	Ven 14/03/1	Jeu 20/03/1	65
65		Portes palières	10 jours	Ven 28/02/1	Jeu 13/03/1	63
66		Portes caves	10 jours	Ven 28/02/1	Jeu 13/03/1	65FF
67						
68		**LOT 08 : RAVALEMENT/ISOLATION PAR L'EXTERIEURE**	**60 jours**	**Ven 14/02/14**	**Jeu 08/05/14**	
69		Preparation / nettoyage	10 jours	Ven 14/02/1	Jeu 27/02/1	60
70		Enduit	35 jours	Ven 28/02/1	Jeu 17/04/1	69
71		Isolation exterieure	20 jours	Ven 28/02/1	Jeu 27/03/1	69
72		Traitement et finitions diverses	15 jours	Ven 18/04/1	Jeu 08/05/1	70
73						
74		**LOT 09 : ELECTRICITE- COURANT FORT/COURANT FAIBLE**	**115 jours**	**Ven 29/11/13**	**Jeu 08/05/14**	
75		Dépose installations existantes	15 jours	Ven 29/11/1	Ven 20/12/	76DF
76		Installation electriques courants forts	60 jours	Ven 20/12/13	Jeu 13/03/14	56DD
77		Appareillage	15 jours	Ven 14/03/1	Jeu 03/04/1	65
78		Installation electriques courants faible	40 jours	Ven 14/03/14	Jeu 08/05/14	76
79		Appareillage	15 jours	Ven 14/03/1	Jeu 03/04/1	65
80						
81		**LOT 10 : CHAUFFAGE / VMC**	**65 jours**	**Ven 17/01/1**	**Jeu 17/04/1**	

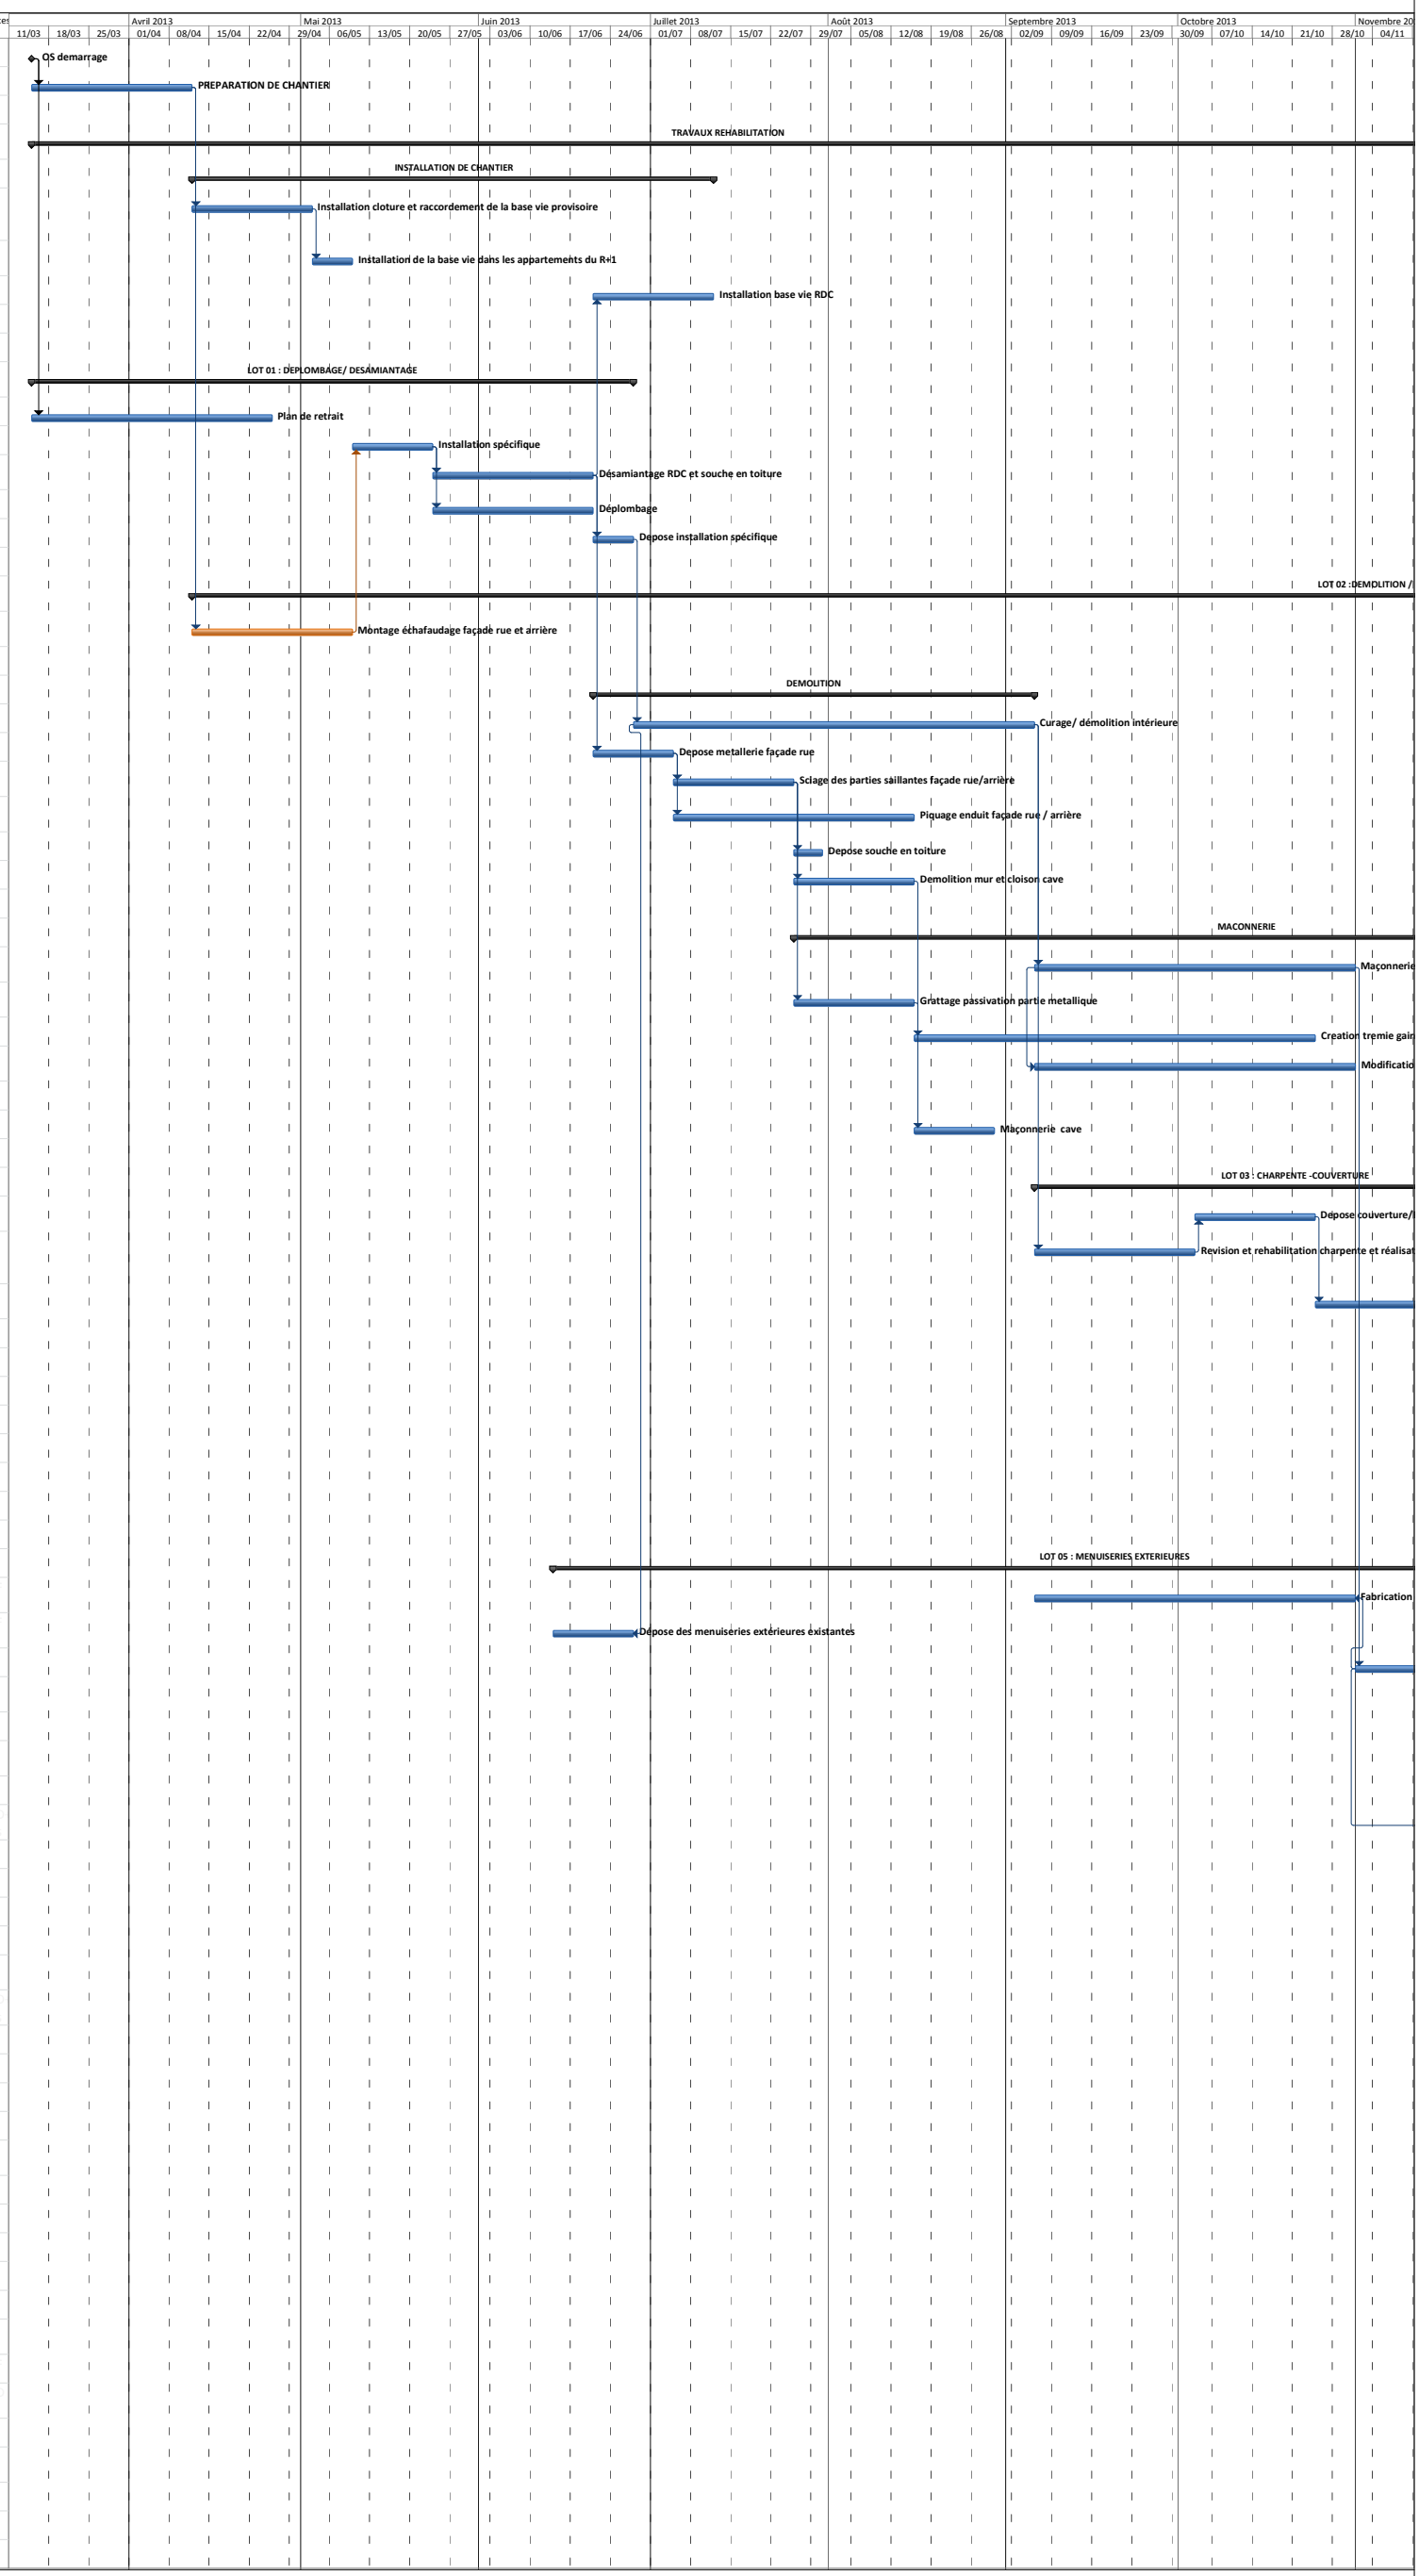

Projet : planning ind 0 02022013
Date : Lun 16/06/14

Tâche		Récapitulative		Jalons externes		Récapitulatif inactif		Report récapitulatif manuel		Fin uniquement			
Fractionnement		Récapitulatif du projet		Tâche inactive		Tâche manuelle		Récapitulatif manuel		Échéance			
Jalon		Tâches externes		Jalon inactif		Durée uniquement		Début uniquement		Avancement			
